

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



MISSION D'AUDIT TECHNIQUE INDEPENDANT DES MARCHES
PUBLICS AU TITRE DE L'ANNEE 2022

*RAPPORT SEPRE DE REVUE DE LA MATERIALITE PHYSIQUE DES
MARCHES DE L'AGENCE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE EN MILIEU RURAL (ANAEPMR)*

Sommaire

I. LETTRE INTRODUCTIVE	3
II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE	5
III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE.....	5
IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES).....	7

I. LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Directeur Général de l'Agence Nationale d'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural

A

Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin (ARMP)

Conformément à notre contrat de marché, nous avons procédé à la réalisation de la revue de la matérialité physique des marchés publics de votre structure au titre de l'exercice budgétaire 2022. Les marchés sélectionnés dans le cadre de cette revue sont présentés dans le tableau ci-après et représentent en moyenne 30% du nombre de marchés sélectionnés pour la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés :

N°	Objet du marché	Type de marché	Montant FCFA HT	RP ou RD à la date de la revue
1	Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Travaux	1 010 544 974	RP
2	LOT 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Fourniture	9 340 500	RP
	LOT 2 : Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : LOT 2		30 745 000	RP
	LOT 3 : Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3		17 660 000	RD
3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV	Pi	95 285 000	RD
Total HT			1 163 575 474	

RP=Réception provisoire ; RD=Réception définitive

Ce rapport s'articule en trois (03) parties essentielles à savoir :

- Le Rappel de l'objet de la revue de matérialité physique ;
- Les conclusions sur la revue de matérialité physique ;
- Annexes_ Fiches de revue de matérialité physique par marché & vues photographiques

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Cotonou, le 29 mai 2025



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO

Chef de fil du groupement SYNEX CONSULTING-CCA-Expertises

Associé Gérant du Cabinet SYNEX CONSULTING

Expert-comptable Diplômé

II. RAPPEL DE L'OBJET DE LA REVUE DE MATERIALITE

Cette revue se traduit essentiellement par des inspections physiques in situ qui seront effectuées sur les marchés sélectionnés avec pour objectifs principaux de :

- Vérifier la matérialité des biens/ouvrages livrés ;
- Vérifier la cohérence entre les biens/ouvrages livrés inspectés et les documents contractuels ;
- Donner un avis sur la conformité et la qualité technique des biens/ouvrages.

III. CONCLUSIONS DES CONSTATS SUR LA MATÉRIALITÉ PHYSIQUE

A l'issue de nos vérifications, la mission a abouti aux conclusions générales ci-après sur les marchés audités :

T2 – Conclusions sur la matérialité physique des marchés

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les Deux (02) marchés sélectionnés				
	Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	1	2			3
		LOT 1	LOT 2	LOT 3	
1. Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	N/A
2. Réalité physique du bien ou de l'ouvrage	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
3. Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Conformes	Conformes	Conformes	Conformes	Conformes
4.1. Conformité physique des prestations ou fournitures avec les documents liés à l'exécution	Conformes	Conformes	Conformes	Conformes	Conformes
4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques	Conformes	Conformes	Conformes	Conforme	N/A

Rubriques	Principales conclusions de la revue sur les Deux (02) marchés sélectionnés				
	Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	1	2			3
		LOT 1	LOT 2	LOT 3	
4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Conformes	Conformes	Conformes	Conformes	N/A
4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
5.Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	N/A
6.Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction	RAS	N/A	N/A	N/A	N/A
7.Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux	RAS	N/A	N/A	N/A	N/A
8.Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	RAS	RAS	RAS	Néant	Conforme
9.Existence d'un Avenant au marché initial	Néant	Néant	Néant	Néant	N/A
10.Recommandations	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
Opinion générale de l'auditeur	Opinion « sans réserve »	Opinion « sans réserve »	Opinion « sans réserve »	Opinion « sans réserve »	Opinion « sans réserve »

IV. ANNEXES (FICHES DE REVUE DE MATÉRIALITÉ PHYSIQUE PAR MARCHE & VUES PHOTOGRAPHIQUES)

Le résumé des constats des marchés se présente comme suit :

T3 – Résumé des constats sur les marchés ayant fait l'objet de matérialité

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF 62496			PI DPET 63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
RM01	Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique	Absence du Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la	Les travaux sont réalisés à la suite d'étude de faisabilité couvrant tous les aspects passés en revue. Aussi, un dossier d'exécution a été fourni par l'entreprise titulaire du marché et approuvé par la mission de contrôle avant le début des travaux.	Les spécifications techniques sont élaborées par le service demandeur et validées avant le lancement de la procédure de passation du marché	Les spécifications techniques sont élaborées par le service demandeur et validées avant le lancement de la procédure de passation du marché	Les spécifications techniques sont élaborées par le service demandeur et validées avant le lancement de la procédure de passation du marché	Non applicable

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		réalisation des travaux					
		Absence du PV de réunion de chantier	Les PV de réunions hebdomadaires et mensuels de chantiers sont disponibles et joints aux rapports mensuels du bureau de contrôle.	N/A	N/A	N/A	Non applicable
		Absence du Rapport de supervision et de contrôle du service	Les rapports mensuels de surveillance et de contrôle des travaux sont fournis et vérifiés par la mission	N/A	N/A	N/A	Non applicable

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF 62496			PI DPET 63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		technique ou du bureau de contrôle					
		Absence du PV de réception définitive en cas d'extinction du délai de garantie	Les travaux n'ont pas encore fait l'objet de réception définitive.	Les fournitures sont provisoirement réceptionnées. La réception définitive n'est pas encore prononcée	Les fournitures sont provisoirement réceptionnées. La réception définitive n'est pas encore prononcée	Oui, les équipements sont déjà réceptionnés définitivement sanctionné par un PV de réception définitive.	Conforme
		Absence des Factures envoyées	Les factures sont communiquées à la mission.	Les factures sont communiquées à la mission.	Les factures sont communiquées à la mission.	Les factures sont communiquées à la mission.	

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		par le titulaire					
		Absence des Décomptes & Attachements annexés aux factures envoyées par le titulaire	Les décomptes et attachements sont conformes aux différents paiements effectués. Lesdits décomptes sont joints aux dossiers de paiement	N/A	N/A	N/A	Non applicable
RM02	Réalité physique	Ouvrage, fourniture /équipem	Les travaux sont réalisés suivants les prescriptions techniques du marché. Le	Les équipements sont livrés et conformes aux	Les équipements sont livrés et conformes aux	Les équipements sont livrés et conformes aux	Conforme

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF 62496			PI DPET 63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		ent/Livrables inexistant	taux d'exécution physiques est de 100% et les travaux sont réceptionnés provisoirement.	spécifications techniques requises	spécifications techniques requises	spécifications techniques requises	
RM03	Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre	Non-Conformité de la prestation par rapport à son offre	Les travaux réalisés sont conformes d'une part au contrat signé mais également à l'offre soumise après les différentes vérifications faites par la mission.	Les équipements livrés sont conformes aux équipements proposés dans l'offre du soumissionnaire	Les équipements livrés sont conformes aux équipements proposés dans l'offre du soumissionnaire	Les équipements livrés sont conformes aux équipements proposés dans l'offre du soumissionnaire	Conforme
		Non Concordance entre les documents de la	La documentation relative à l'exécution du marché est en parfaite concordance avec la documentation relative à la passation du marché.	La documentation relative à l'exécution du marché est en parfaite concordance avec la	La documentation relative à l'exécution du marché est en parfaite concordance avec la documentation relative à la passation du marché.	La documentation relative à l'exécution du marché est en parfaite concordance avec la documentation relative à la passation du marché.	Conforme

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		passation et ceux de l'exécution	Aucune non concordance n'a été décelée.	documentation relative à la passation du marché. Aucune non concordance n'a été décelée.	Aucune non concordance n'a été décelée.	Aucune non concordance n'a été décelée.	
RM04	4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution	Caractéristiques de l'Ouvrage, fourniture /équipement/Livrables non conformes avec les PV de	La mission certifie sur la base de la documentation mise à sa disposition d'une part et sur la base des vérifications faites sur le terrain que les ouvrages réalisés sont conformes aux documents contractuels.	La mission certifie que les équipements livrés sont conformes aux documents contractuels.	La mission certifie que les équipements livrés sont conformes aux documents contractuels.	La mission certifie que les équipements livrés sont conformes aux documents contractuels	Conforme

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		réception, les rapports du bureau d'études et de contrôle, la comptabilité matières (prise de vues)					
	4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de	Non-conformité de l'Ouvrage	Les ouvrages réalisés sont conformes aux différents plans approuvés et au cahier des charges	Les équipements livrés sont conformes au cahier des charges	Les équipements livrés sont conformes au cahier des charges	Les équipements livrés sont conformes au cahier des charges	Conforme

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
	contrôle par rapport aux constatations physiques	e, fourniture /équipement par rapport aux plans et cahier des charges					
	4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges	Non-conformité de la construction (T) par rapport aux	Les travaux ont été réalisés suivant les règles de l'art et en adéquation avec les spécifications techniques.	Les équipements sont livrés suivant les règles de l'art et en adéquation avec les spécifications techniques.	Les équipements sont livrés suivant les règles de l'art et en adéquation avec les spécifications techniques	Les équipements sont livrés suivant les règles de l'art et en adéquation avec les spécifications techniques.	

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		normes et réglementation en vigueur en matière de construction					
	4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu		Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art et réceptionnés provisoirement.	Les équipements ont été acquis conformément aux quantités et spécifications techniques définies dans le contrat. Il convient de	Les équipements ont été acquis conformément aux quantités et spécifications techniques définies dans le contrat. Il convient de souligner que tous les équipements sont estampillés, en bon état	Les équipements ont été acquis conformément aux quantités et spécifications techniques définies dans le contrat. Il convient de souligner que tous les équipements sont estampillés, en bon état de	Conforme

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
				souligner que tous les équipements sont estampillés, en bon état de fonctionnement et ont été réceptionnés de manière provisoire.	de fonctionnement et ont été réceptionnés de manière provisoire.	fonctionnement et ont été réceptionnés de manière définitivement.	
RM05	Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage	Non concordance entre les quantités de matériaux ou d'intrants	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière	Non applicable

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		sélectionnés à partir des essais physiques effectués (voir les attachements pour les travaux)					
RM07	Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant	Identification de risques sociaux et environnementaux	Nous ne notons aucun risque social et environnemental et le PGES a été mis en œuvre au cours de l'exécution des travaux	N/A	N/A	N/A	Non applicable


N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF 62496			PI DPET 63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
	découler des travaux	inhérents soit à l'usage des biens livrés dans le temps soit à leur rythme rapide d'obsolescence (prendre la photo et faire les commentaires					

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF_62496			PI_DPET_63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEMPR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEMPR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		nécessaires)					
RM08	Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit	Paie ment s effectués non en corrélation avec le niveau d'exécution physique des travaux	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière	Pas d'observation particulière	Conforme
RM09	Existence d'un Avenant au marché initial	Modifications apportées	N/A	N/A	N/A	N/A	

N°	Référence du marché		LIMITE	F_DAF 62496			PI DPET 63882
	Rubriques		Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV	Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) : LOT 1	Acquisition de matériels informatique et accessoires nécessaires pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : LOT 2	Acquisition de fauteuils et mobiliers pour la salle de conférence et les bureaux de l'ANAEPMR : LOT 3	Surveillance et contrôle des travaux confortatifs de la cadre de la construction de la STBV
	Montant du marché HT		1 010 544 974	9 340 500	30 745 000	17 660 000	95285000
	Titulaire du marché		CGTS Sarl	SCTT Sarl	SCTT Sarl	BECOTRAC Sarl	SETEM BENIN
	Date de l'ordre de service		04/08/2022	04/01/2023	04/12/2022	07/12/2022	20/07/2022
	Durée d'exécution des travaux ou du marché		5 MOIS	2 MOIS	15 JOURS	15 JOURS	
	Réception provisoire ou Réception définitive		RP	RP	RP	RD	RD
	Risque d'anomalies vérifiés						
		aux quantités et mètres en cours de chantier non justifiées					
		Modifications apportées non visibles physiquement	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VUES PHOTOGRAPHIQUES

Réalisation des travaux confortatifs dans le cadre de la STBV

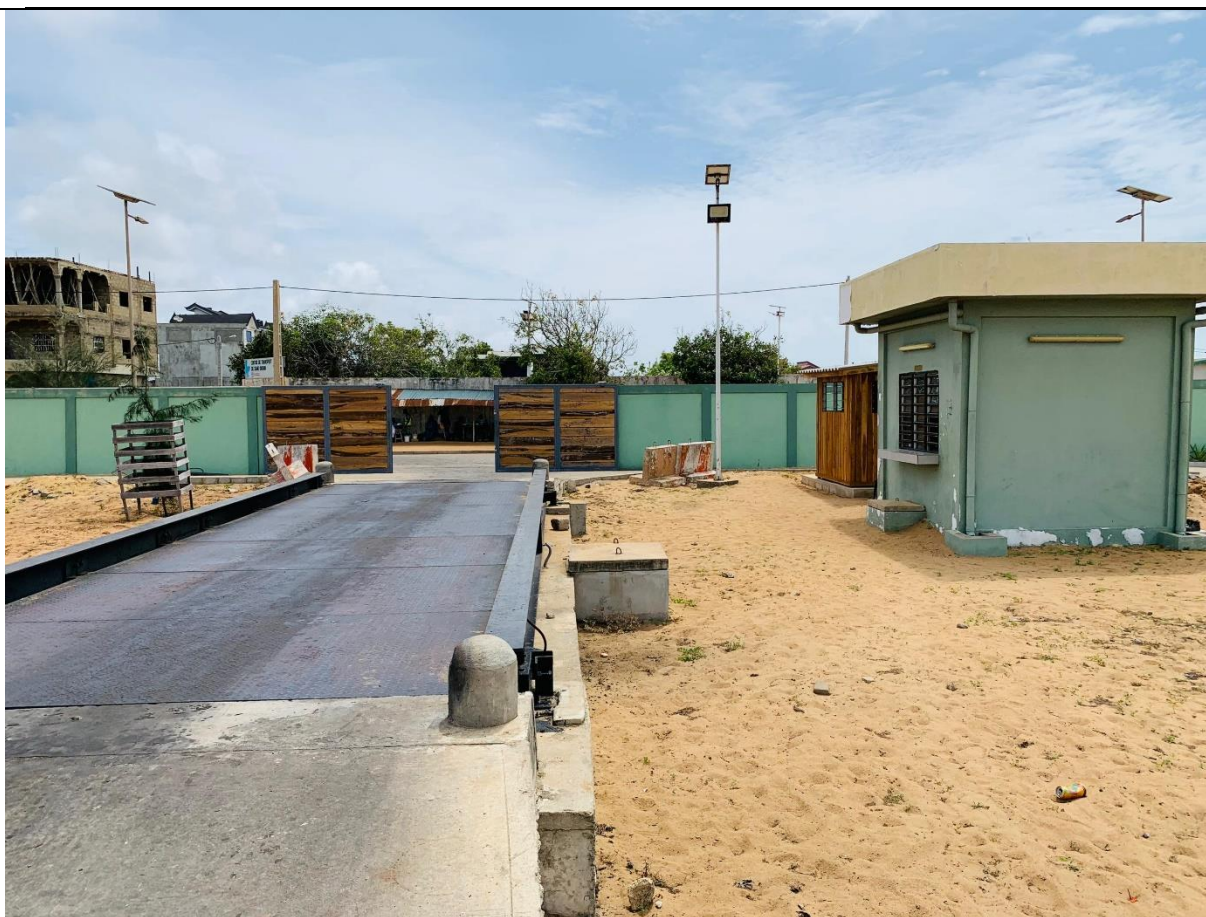







Acquisition de matériels informatiques et accessoires, de mobiliers de bureau, d'équipements et matériels au profit du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME), de l'ANAEPMR et pour la mise en place du système d'archivage physique et électronique de l'ANAEPMR : Lots 1, 2 et 3.

